NUEVA VICENTIN · NODO SUR · INFORME MES A MES

Proyecto Cámaras TruckFlow — Lo que hicimos mes a mes

16/10/2026 · Contrera Jose

Lo que hicimos mes a mes, de febrero a octubre de 2026, en el Nodo Sur de Nueva Vicentin (Ricardone y puerto de San Lorenzo): el trabajo de cada mes, lo que se coordinó con cada actor y lo que quedó pendiente, con capturas de la plataforma y de los comités.

CONTENIDO

01 **Febrero y marzo** hoja 2

02 **Abril** hoja 5

03 **Mayo** hoja 7

04 **Junio** hoja 9

05 **Julio** hoja 13

06 **Agosto** hoja 15

07 **Septiembre** hoja 18

08 **Octubre** hoja 22

– **Cierre** · Coordinación, resultados y pendientes hoja 28

Febrero y marzo

01

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026


Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho


- Propuesta de base (versión 1.8, 23/01): 34 cámaras en Ricardone y 28 en San Lorenzo, reutilizando el cableado existente, instalación en dos etapas (70 % y 30 %).
- 10/02: primera versión del tablero con rutas, visitas y análisis de anomalías.
- 04–06/03: circuitos de Ricardone y San Lorenzo en PDF con sus variantes; se suman dos circuitos a Ricardone.
- 06–09/03: inicio modelado 3D de Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda.
- 09–12/03: catálogo de cámaras y circuitos, primer simulador con datos sintéticos de marzo (incluye líquidos y transile).
- 12–13/03: relevamiento de Avellaneda con el encargado de balanza.
- 20/03: indicador de saturación y estadía (diagrama de cajas, histograma, exportación).

Modelo 3D y caminos


En marzo se modelaron Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda en Revit/IFC y se marcó el camino de cada operación: 22 circuitos de Ricardone, 12 de San Lorenzo y 9 de Avellaneda. En rosa, el ingreso y la espera; en azul, el tramo de descarga; en rojo, el punto de destino.

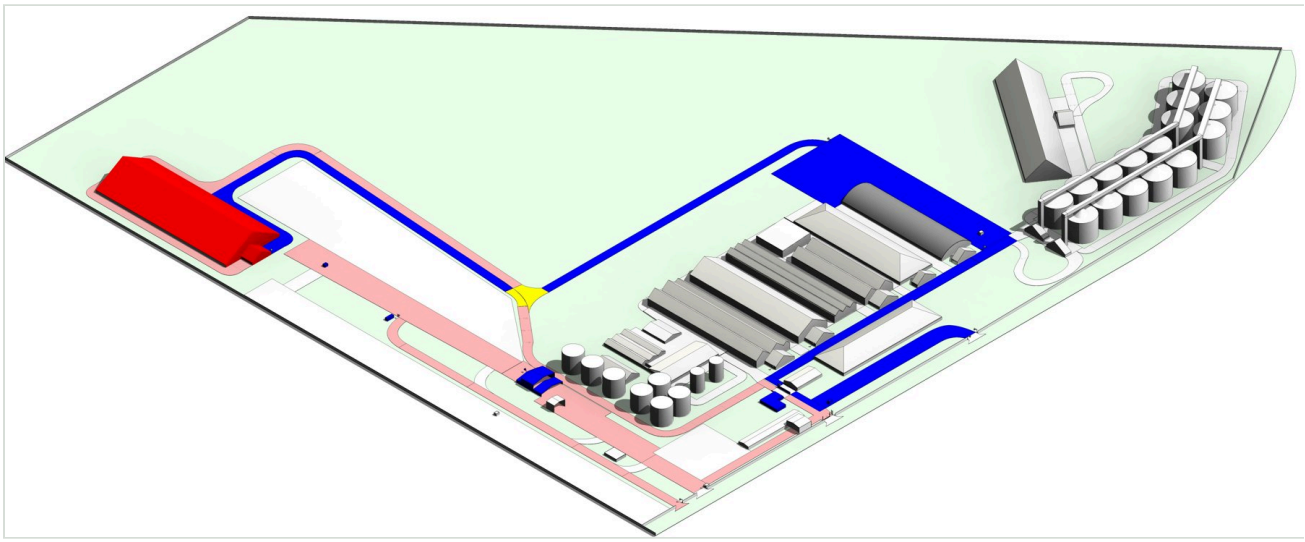

Ricardone · descarga en Celda 6. El camino sale de la balanza, cruza el nudo central (amarillo) y llega a la celda (rojo).

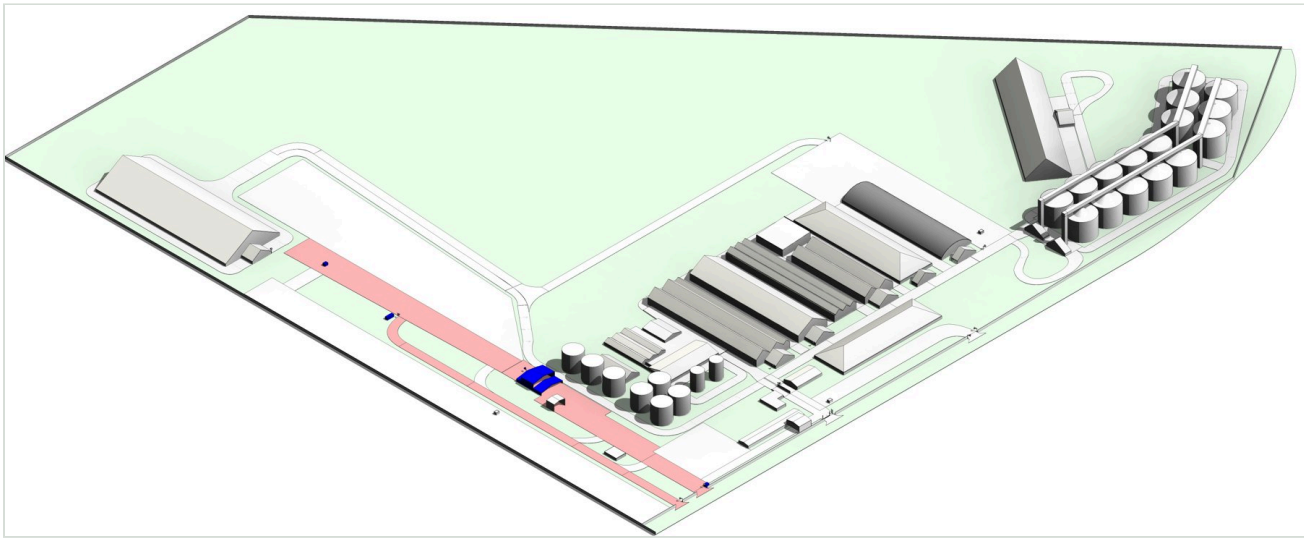

Ricardone · circuito de soja al puerto (R7): ingreso, Playa 1 y calzada (rosa), balanza (azul) y salida hacia San Lorenzo.

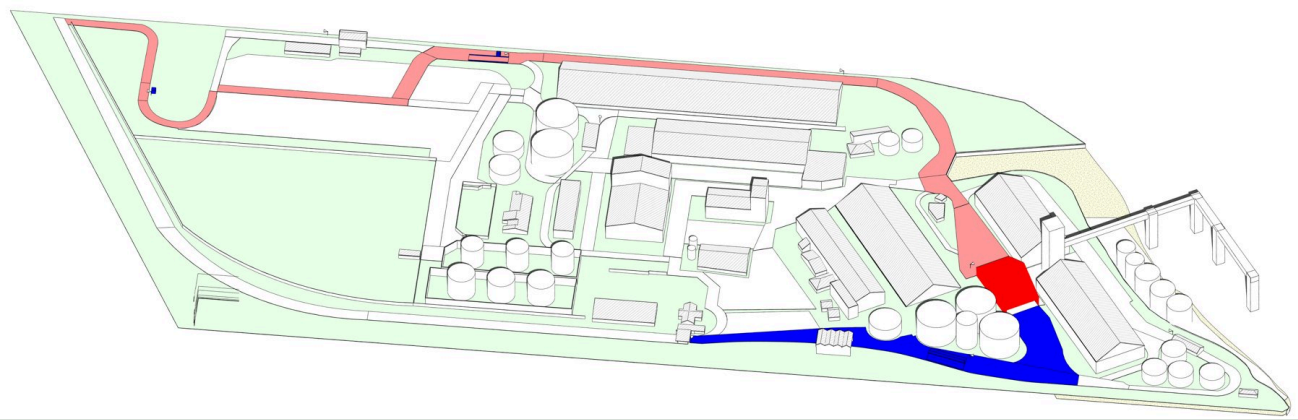

San Lorenzo · descarga de sólidos: Playa OSL e ingreso (rosa), volcable (rojo) y salida (azul).

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
04/03	Juan Strada (Logística Ricardone)	Corrección de circuitos, rechazo por peso, bloqueo de 2 h por calidad, Celda 16, Playa 1 y Playa 3
05/03	Marcelo Trivero	Deriva la validación de los circuitos de San Lorenzo a Gustavo Scandolo
06/03	Scandolo, Darío Falletti, Juan Manuel Doin (San Lorenzo)	Preingreso, demoras en tránsito, recalados, doble paso, puntos de carga
19/03	Enesimal (Eleazar Garrido, Germán Giró)	Reunión técnica: cámaras, VMS, Edge, microservicio, rutas válidas
25/03	Infraestructura NVA (Luciano Baetti)	La red no soporta tráfico nuevo: se instala, se verifica cada cámara en el DSS y se apaga hasta reforzar la red
27/03	Strada, Pablo Romero	Pedido de stock en silos y celdas y balance de masa (sin respuesta)
30/03	IT NVA (Gastón Distefano, Juan Pablo Martínez)	Visita a la sala de servidores: servidor DSS, TruckFlow Edge y VPN

Abril

02

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho

- Matriz de circuitos de recepción, despacho y transile, de sólidos y líquidos, con su secuencia de cámaras.
- Recorridos especiales definidos: esperas en playa, recalados, rechazos, observaciones de calidad, ajustes de peso, vueltas y transiles.
- Indicadores de estadía, flujo, congestión y anomalías para el comité; indicador multinivel en el tablero (14/04).
- 21/04: entrega de la matriz y las secuencias compartidas entre plantas; consulta por S6 Ricardone y S8 San Lorenzo.

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
07/04	Enesimal	Cronograma de instalación
20/04	Enesimal (Agustín Ríos)	Edge desplegado en el datacenter, ya recibe eventos; pide las rutas
21/04	Enesimal (Germán Giró)	Informe de avance: Edge y Service fase 1 completos, servidor con DSS Pro V8 y VPN entre plantas, 18 cámaras; S6 y S8 requieren acordar red, compra y montaje
22/04	Mantenimiento San Lorenzo	Comité de mantenimiento

Mayo

03

COMITÉS DEL MES, SEMANA A SEMANA

Fecha	Comités	Semana analizada
29/05	1 · Seguridad (cierre de 4 comités de seguimiento del mes)	—

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho

- 05–07/05: paso a datos reales; diagnóstico de recorridos (normalización de eventos, cobertura por cámara, incompletos).
- 12/05: primera semana guardada (12–17/05).
- 18–19/05: pipeline del comité y servidor local de procesamiento.
- 26–28/05: reglas v9, catálogo de cámaras de San Lorenzo y ruta Ricardone → San Lorenzo; matriz de circuitos válidos con San Lorenzo corregido.
- Clasificación en cuatro grupos: completo, variación operativa, incompleto y anómalo. Recalados, esperas, dobles pesadas y rechazos son variaciones, no anomalías.
- 4 reuniones de seguimiento;

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
06–07/05	Enesimal (Agustín Ríos)	Rutas válidas configuradas; base de eventos reiniciada («salida a producción»); sin paginación, límites de espacio e histórico
04 y 15/05	Mantenimiento	Módulo de mantenimiento con Revit; listado de OT 2025–2026
25–26/05	Instalación NVA (Lucas Gobbo, Franco Mazzetti) y A&T	Reunión de coordinación: responsables, permisos, cierre diario. Las canalizaciones nuevas exceden el alcance original. Avance: Ricardone 80 %, total 70 %
27/05	A&T	Se corta el cableado de S10 San Lorenzo por un paro
29/05	Walter García (NVA)	Envía la norma de instalación NVA-TEM-STD-E-INS-001
29/05	Reunion de seguimiento	3.660 circuitos tras el ETL; 105 camiones en Celda 16 en 8 días;

Pendiente al cierre: paginación y retención de eventos, reanudar S10 San Lorenzo y definir el alcance adicional de canalizaciones.

Junio

04

COMITÉS DEL MES, SEMANA A SEMANA


Fecha	Comités	Semana analizada
10/06	1 · Seguridad y eficiencia	29/05–02/06
18/06	1 · Seguridad y eficiencia	04–11/06
24/06	1 · Seguridad y eficiencia	14–21/06

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar · Abr · May · **Jun** · Jul · Ago · Sep · Oct · Cierre

Trabajo hecho


- 01/06: tiempos por tramo (ingreso, preingreso, calada, balanza, descarga, interplanta, egreso) con media, desvío y distribución.
- 04–05/06: los datos de balanza del sistema de camiones se usan para calibrar las cámaras: cada lectura se compara con lo que registró la planta.
- 11–12/06: procesamiento por línea de comandos, ocupación de sectores cada 30 min, percentil 90.
- 16–19/06: auditorías calibracion por cámara comparando sistema de camiones
- 26/06: análisis por franja horaria (Q1–Q4) de los tramos de más peso.
- 29–30/06: circuito de aceite y cámaras de líquidos de San Lorenzo.
- Primeros datos de San Lorenzo: balanzas de ingreso y egreso, portería y líquidos OSL.
- Comités del 10/06, 18/06 y 24/06. El del 18/06 deja la acción «revisar capacidad e ingresos nocturnos».

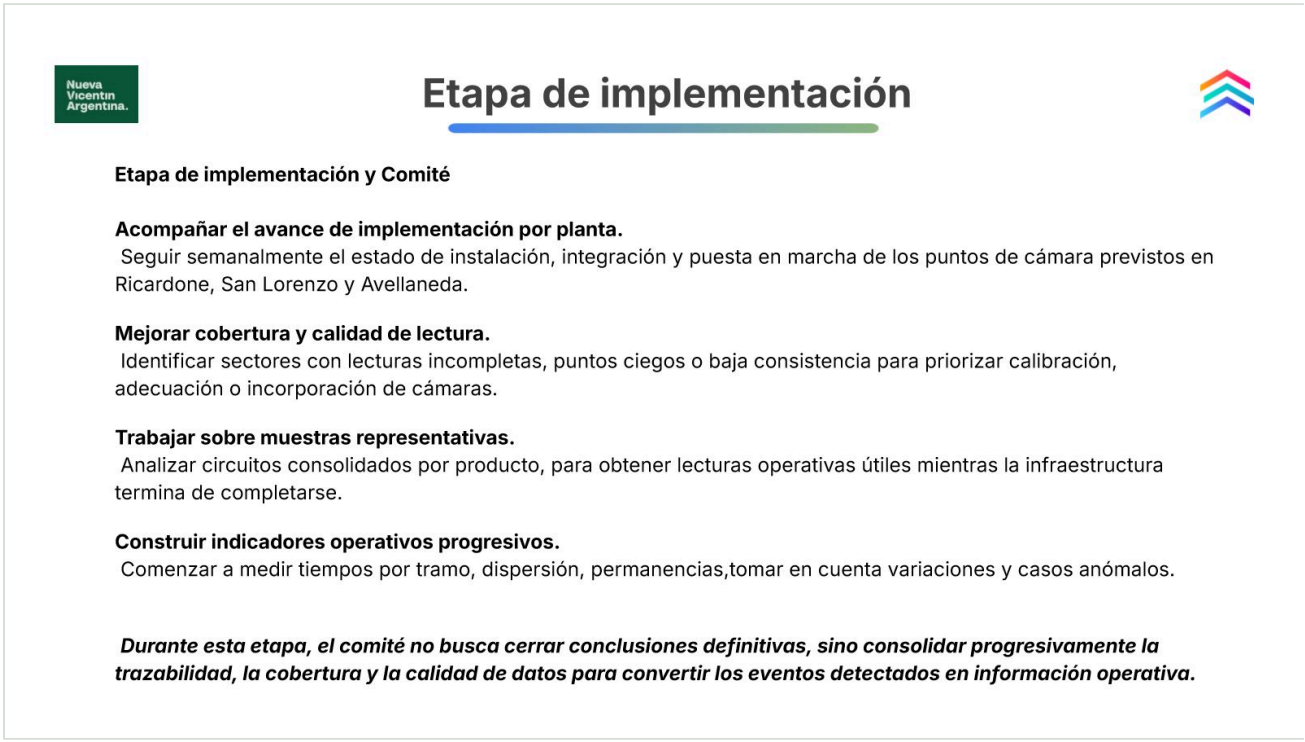

Comité 10/06 · qué se propuso medir en la etapa de implementación.



Comité 10/06 · R7 soja dividido en siete tramos, de Ricardone al puerto.

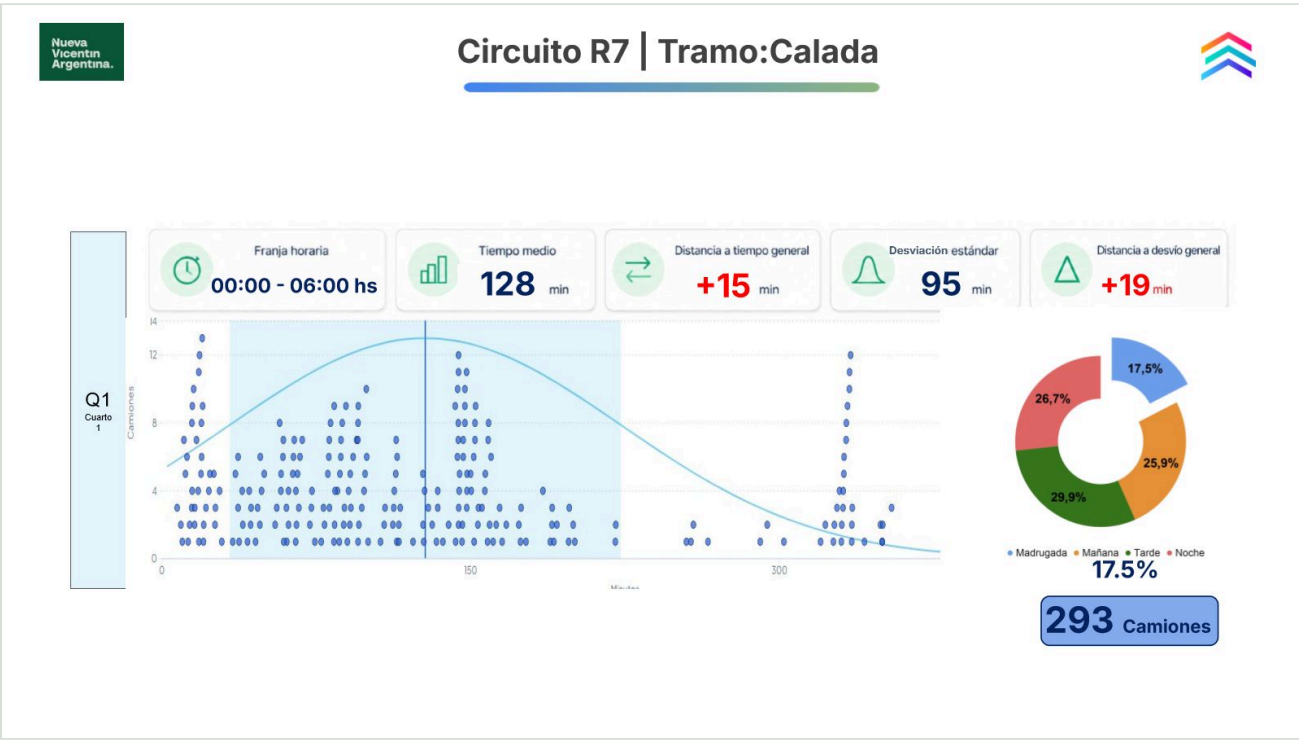

Comité 24/06 · calada de R7 en la franja 00–06 h: 128 min de media, +15 contra el promedio, 293 camiones.

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
01–02/06	Instalación NVA (Lucas Gobbo)	Montajes observados por no cumplir la norma: 80 % de Ricardone y 30 % del puerto; falta la definición comercial y técnica entre A&T, BIMtrazer y Enesimal

Fecha	Con quién	Qué se trató
08/06	Enesimal y A&T	Informe de avance: servidor HPE, DSS y VPN listos; 43 cámaras; faltan 3 faciales y la UPS; red y energía con «serias deficiencias»; demoras de permisos e ingreso; Enesimal asume reemplazar canalizaciones
19/06	IT NVA (Baetti, Martínez, Distefano), CISB (Ariel Aichino), W. García, Gobbo	Infraestructura y cámaras: reconocimiento facial, canalizaciones, red inestable, calibración e iluminación
24/06	IT NVA	Relevamiento de 4 sectores LPR pendientes en Ricardone
24/06	Luciano Torres, Gonzalo Bulzani	Se suman al envío del comité

Pendiente al cierre: 19 cámaras, canalizaciones y alcance adicional, red, calibración e iluminación, cámaras faciales y UPS.

Julio

05

COMITÉS DEL MES, SEMANA A SEMANA

Fecha	Comités	Semana analizada
08/07	1 · Seguridad y eficiencia	22/06–05/07
15/07	1 · Seguridad y eficiencia	06–12/07
23/07	2 · Logística y Seguridad	13–19/07
31/07	2 · Logística y Seguridad	20–26/07

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar | Abr | May | Jun | **Jul** | Ago | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho

- 06/07: primera semana con soja, girasol y aceite juntos (06–12/07).
- 14/07: se corrige la duplicación que inflaba el aceite; reglas de anomalía por evidencia.
- Comités del 08/07, 15/07, 23/07 y 31/07 (este último ya separado en Logística y Seguridad).
- Calibración de S1, S4, S5 y S9; S6, S7 y S8 de Ricardone con mejoras notables.

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
06/07	Juan Carlos Velázquez → Marcelo	Esquema de avance de la fase de implementación con hitos comprometidos
14 y 21/07	A&T e IT NVA (Baetti)	Cable antirroedores en tendidos nuevos y reparación sin cargo del existente; IT acepta cronograma y criterios
16–21/07	IT NVA, A&T, supervisión eléctrica	Visita a la Terminal de Embarque de San Lorenzo
28/07	Enesimal (Germán, Nicolás Cordi)	Sustitucion de camaras faciales por LPR, equipos para S6 y S8, solución para S10 (135 m desde portería)
31/07	IT NVA (Baetti, Distefano)	Pedido formal de red y energía para S10 Salida 4

Pendiente al cierre: S10 sin energía ni red, nota firmada del cable y definición LPR/facial.

Agosto

06

COMITÉS DEL MES, SEMANA A SEMANA


Fecha	Comités	Semana analizada
07/08	2 · Logística y Seguridad	27/07–02/08
14/08	2 · Logística y Seguridad	07–12/08
21/08	2 · Logística y Seguridad	12—20/08
28/08	2 · Logística y Seguridad	20–26/08

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | **Ago** | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho

- Calibración general de Ricardone completa, que pasa a mantenimiento. En San Lorenzo se instalan S1, S4, S5 y S8; quedan por ajustar S7 y S4.
- 04/08: metodología explicada a planta: las cámaras miden la permanencia entre puntos, no la causa; Preingreso→Calada es 35–45 % de la estadía.
- 14/08: franjas unificadas Q1 22–04, Q2 04–10, Q3 10–16, Q4 16–22 h.
- 18–22/08: operativo de pellet de girasol (530 camiones, 14.250 t).
- 27/08: actividad de los volcables del puerto y modelo de control.
- Comités de Logística y de Seguridad el 07/08, 14/08, 21/08 y 28/08.

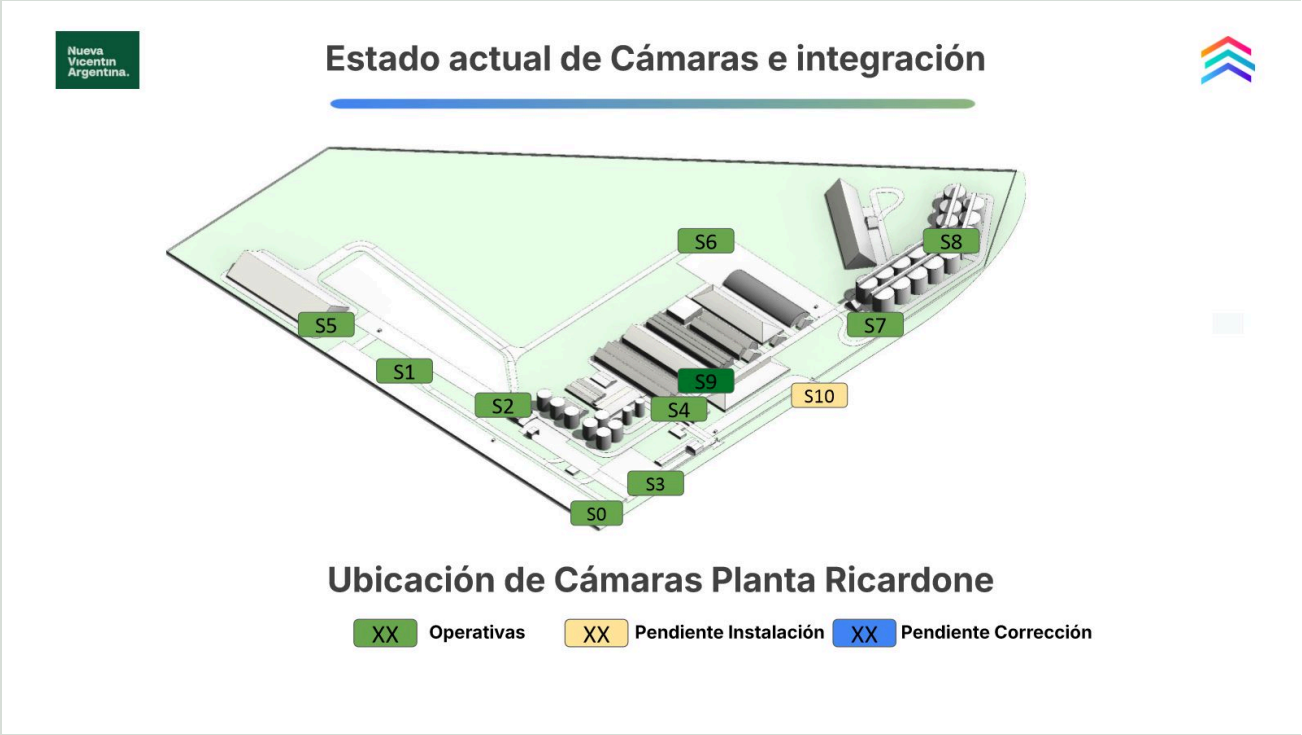

Comité 28/08 · puntos de cámara de Ricardone sobre el modelo 3D: operativos, por instalar y por corregir.



Comité 28/08 · calada del jueves 20/08 por hora: pico de 47 camiones entre las 10 y las 11 h, 408 en el día.

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
03/08	Marcelo → Strada, Bruno Buseghin, Falletti, Scandolo	Pide distribución semanal de los informes
03/08	IT NVA (Distefano)	S10 necesita primero la definición del Departamento Eléctrico y después la fibra de IT
04 y 11/08	Bruno Buseghin	Objeta atribuir la demora a la calada; el precalado pasa a llamarse Playa 1
06/08	Falletti, Bulzani	Análisis de logística

Participantes del Comité de Logística: Buseghin, Bulzani, Falletti, Scandolo, Astorquia, Murillo, Strada, Torres y Trivero. De Seguridad: Falletti, Silva, Edgardo Caruso, Astorquia, Murillo y Trivero.

Septiembre

07

COMITÉS DEL MES, SEMANA A SEMANA

Fecha	Comités	Semana analizada
04/09	2 · Logística y Seguridad	27/08–02/09
11/09	2 · Logística y Seguridad	03–09/09
18/09	2 · Logística y Seguridad	10–16/09
28/09	2 · Logística y Seguridad	17–23/09

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho


- 01/09: panel de volcables del puerto, calada del puerto y calada de líquidos en Ricardone.
- 03/09: reglas v16, rutas por dominio en el tablero, ficha por circuito, composición de rangos con corridas guardadas y reparación de los exportes sin identificador de viaje (desde el 27/08).
- 14/09: calada y plataforma declaradas, sumadas a la calibración de las cámaras.
- 15–17/09: rediseño del tablero, estado de planta en vivo, importación de capturas del DSS y exclusión de camiones de servicio con el registro en vivo.
- 21/09: plano 2D con sectores, cámaras y tramos; portada cartográfica con identidad Nueva Vicentin.
- Comités de Logística y Seguridad el 04/09, 11/09, 18/09 y 28/09.

Comité	Período	R7 puerta a puerta	Playa 1	Playa OSL
04/09	27/08–02/09	379 min	140 min	137 min
11/09	03/09–09/09	276 min	87 min	97 min
18/09	10/09–16/09	334 min	126 min	119 min
28/09	17/09–23/09	303 min	89 min	—


El 28/09 Playa 1 marcó 89 min, el mínimo desde junio. Seguridad sumó el seguimiento de demoras de más de 30 min entre plantas, concentradas en la madrugada (21 de 25 casos el 12/09).

En vivo: la planta en el plano

La vista En vivo muestra cada planta con sus zonas, los camiones en cola y la última captura de cada cámara.

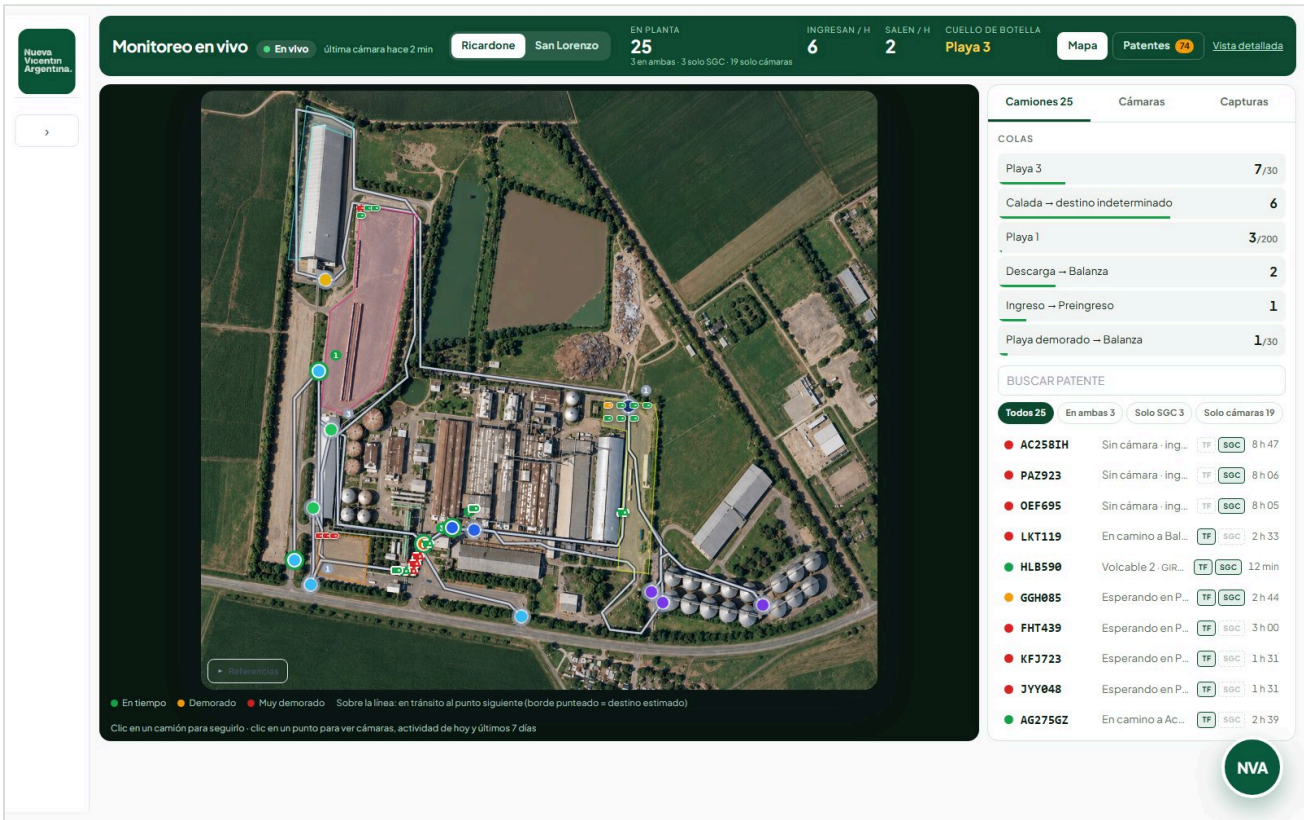


En vivo · Ricardone: recorridos sobre el plano, colas por zona y camiones en planta.

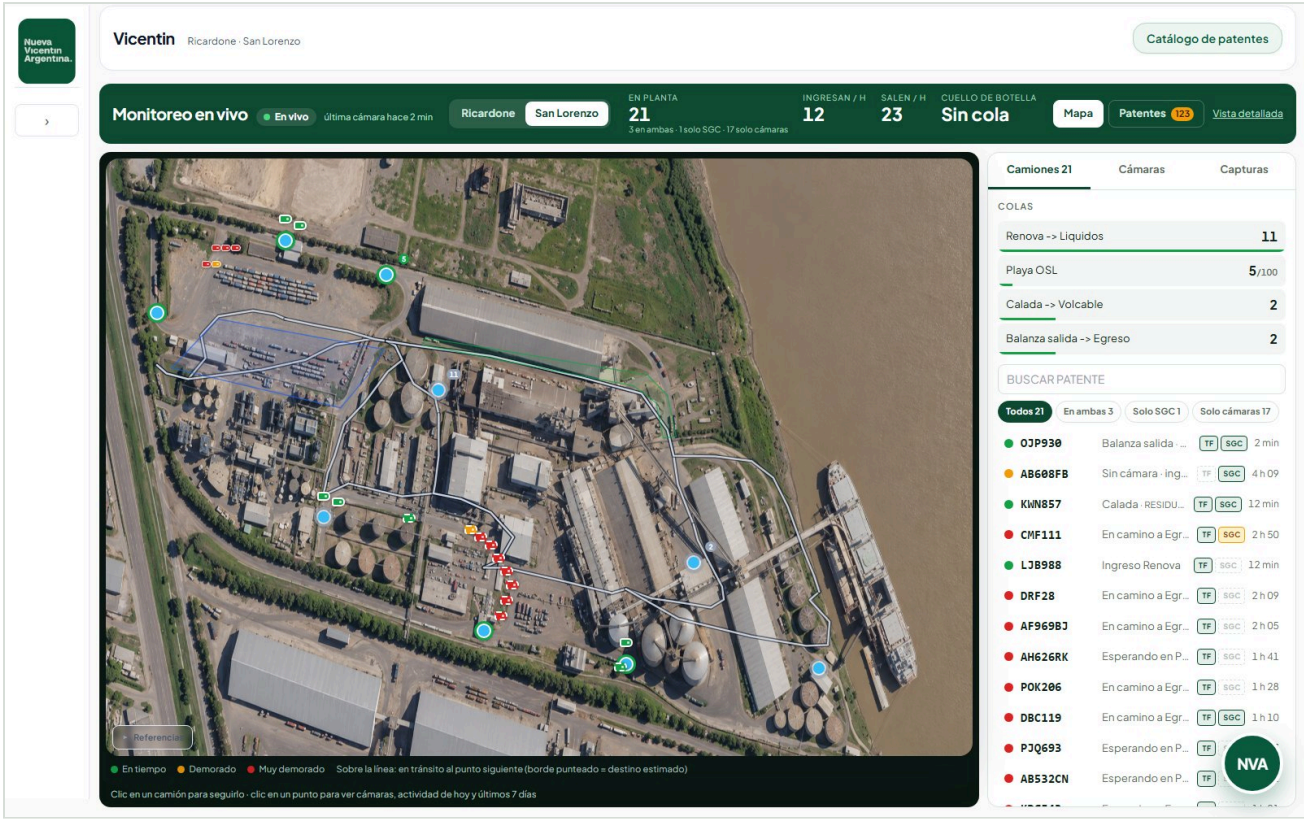

En vivo · puerto de San Lorenzo: Playa OSL, balanzas y volcables.

Comités del mes

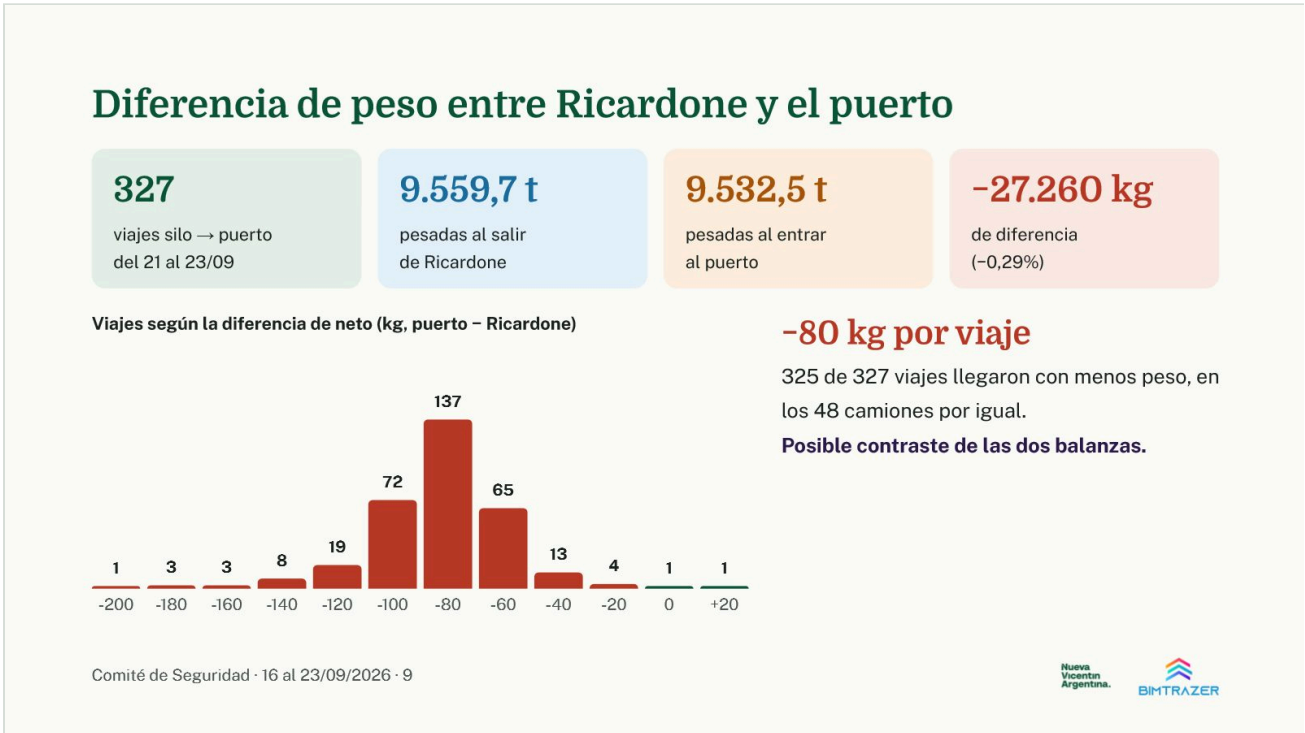

Comité de Seguridad 28/09 · transile silos → puerto: 327 viajes, 27 t menos al entrar al puerto (−0,29 %); 325 de 327 llegaron con menos peso.

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
02/09	Enesimal (Germán, Garrido, Alejandro Gómez)	Despliegue del microservicio de logística
02–03/09	IT NVA (Distefano) y A&T	Acceso para calibrar el puerto: tareas en el portal y 48 h de aviso
15/09	A&T, Distefano, Trivero	Barrera de autos separada de camiones, cierre de cámaras, servidor local de Ricardone y Nodo Norte
16–17/09	Enesimal	Informe de fin de instalación; se acepta con dos reservas (S10 y calidad de lectura). Faltan UPS y 5 LPR
19/09	Infraestructura	Alta de la cuenta AWS
30/09	Enesimal	Presentación de la fase 2 (en revisión de NVA)
30/09	CISB (Ariel Aichino, Luciano Costantini)	Pedido de acceso automático a los datos de balanza (vista base de datos) para calibrar las cámaras de manera automatica

Asistencia al comité: el 04/09 y el 19/09 no se conectó nadie; el 11/09 asistió Diego Silva; el 28/09 Logística no tuvo participantes.

Pendiente al cierre: S10, UPS y 5 LPR; aprobación de la fase 2; asistencia a los comités.

Octubre

08

COMITÉS DEL MES, SEMANA A SEMANA

Fecha	Comités	Semana analizada
05/10	2 · Logística y Seguridad	24/09–04/10
13/10	2 · Logística y Seguridad	05–11/10

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026


Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Cierre

Trabajo hecho

- 05/10: Comité de Logística 24/09–04/10 con líquidos; Comité de Seguridad del mismo período.
- 07/10: identificación de patentes en En vivo por etapas (candidatos, evidencia, foto de la última captura); las correcciones llegan al informe semanal.
- 09/10: algoritmo de universo conocido: 99,1 % del recorrido registrado el 24–30/09 (2.218 camiones) y 98,4 % el 01–07/10; acierta 98 de cada 100 correcciones.
- 13/10: presentación del algoritmo de patentes a gerencia. 14/10: reunión de alineamiento.
- 15–16/10: simulador de días con motor de colas, escenario de llegadas, cupo cada 2 h y operativo de pellet; corrector de patentes con la balanza SGC.


Identificación de patentes en vivo

Simulador de días

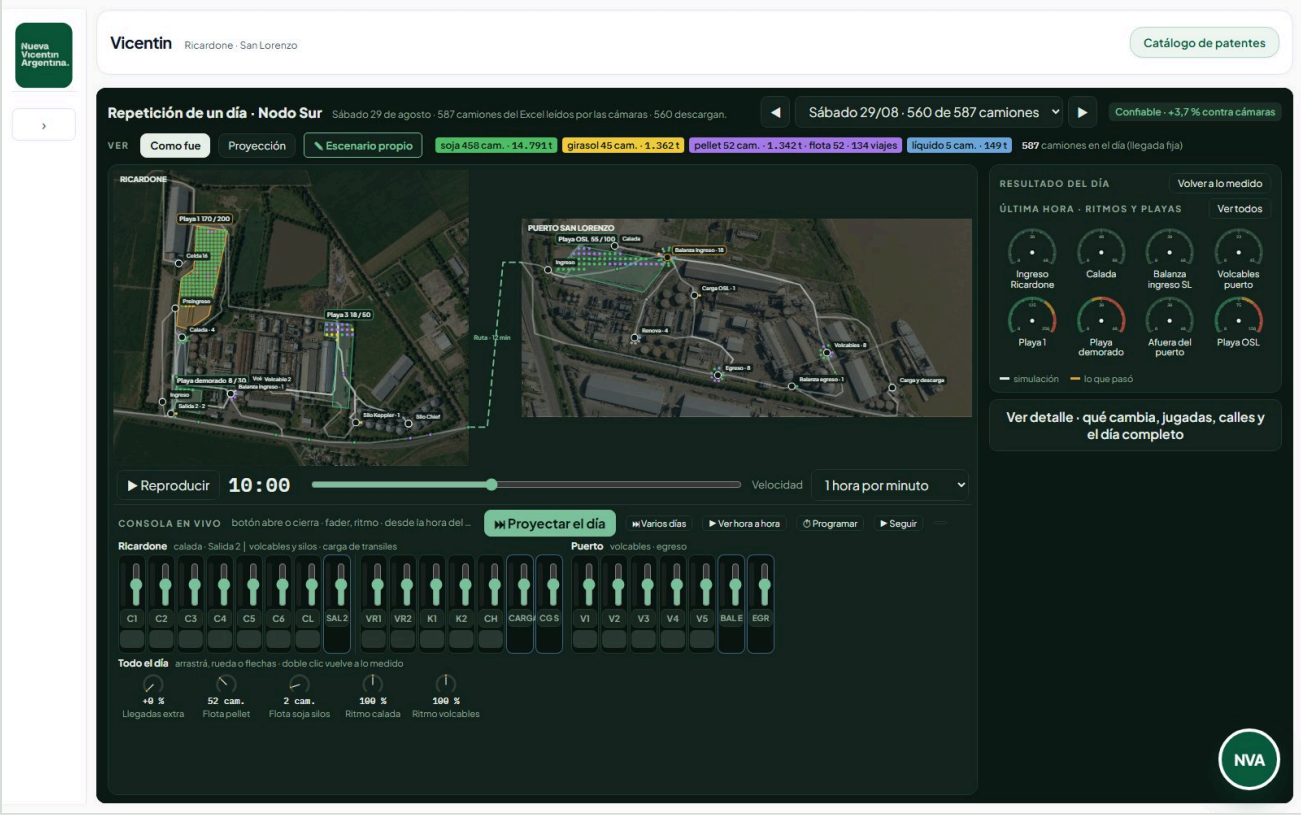

Simulador · repetición del sábado 29/08: 587 camiones, 560 descargas. Permite cambiar ritmo de calada, volcables, flota y cupos de llegada y ver cómo cambian las playas.


Comités del mes

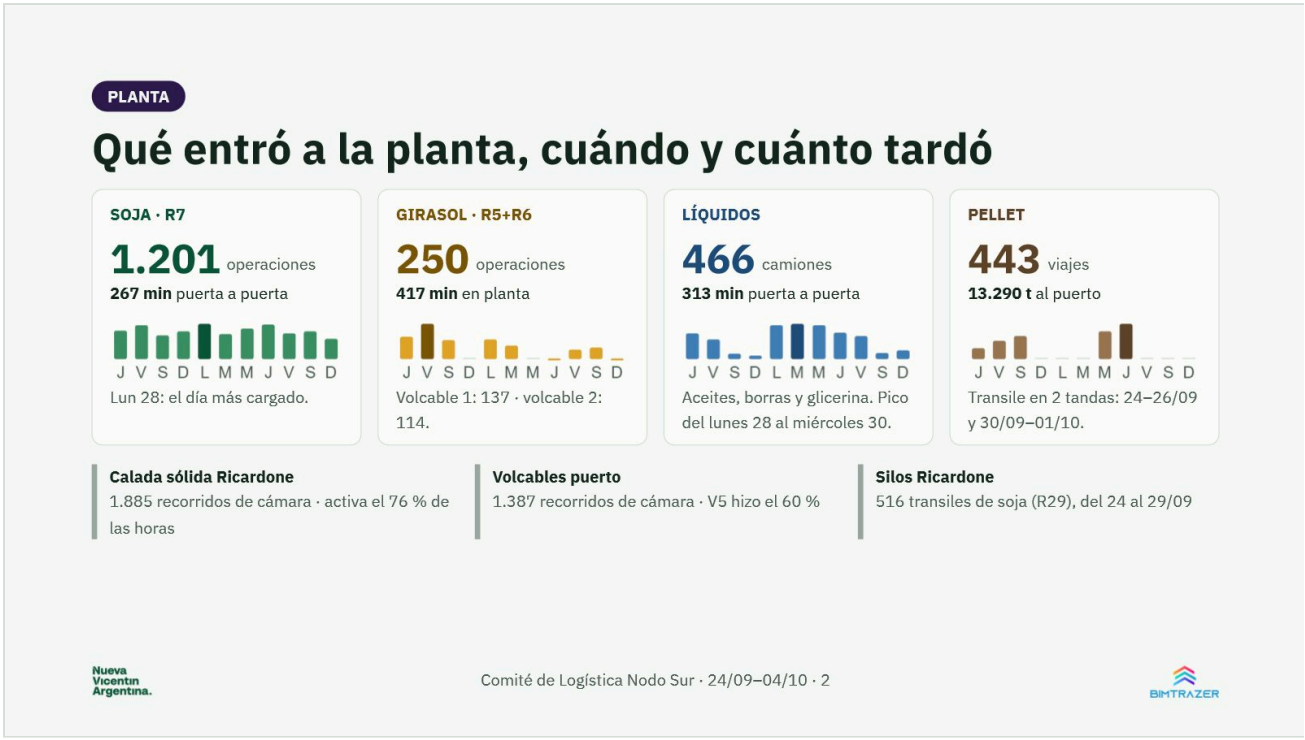


Comité de Logística 24/09–04/10 · por producto: soja 1.201 operaciones y 267 min; girasol 250 y 417 min; líquidos 466 camiones; pellet 443 viajes.




R7 soja, puerta a puerta por comité: 267 min, el más bajo desde junio (promedio de la serie 344). Playa 1 74 min contra 120 de promedio; Playa OSL 190 contra 176.

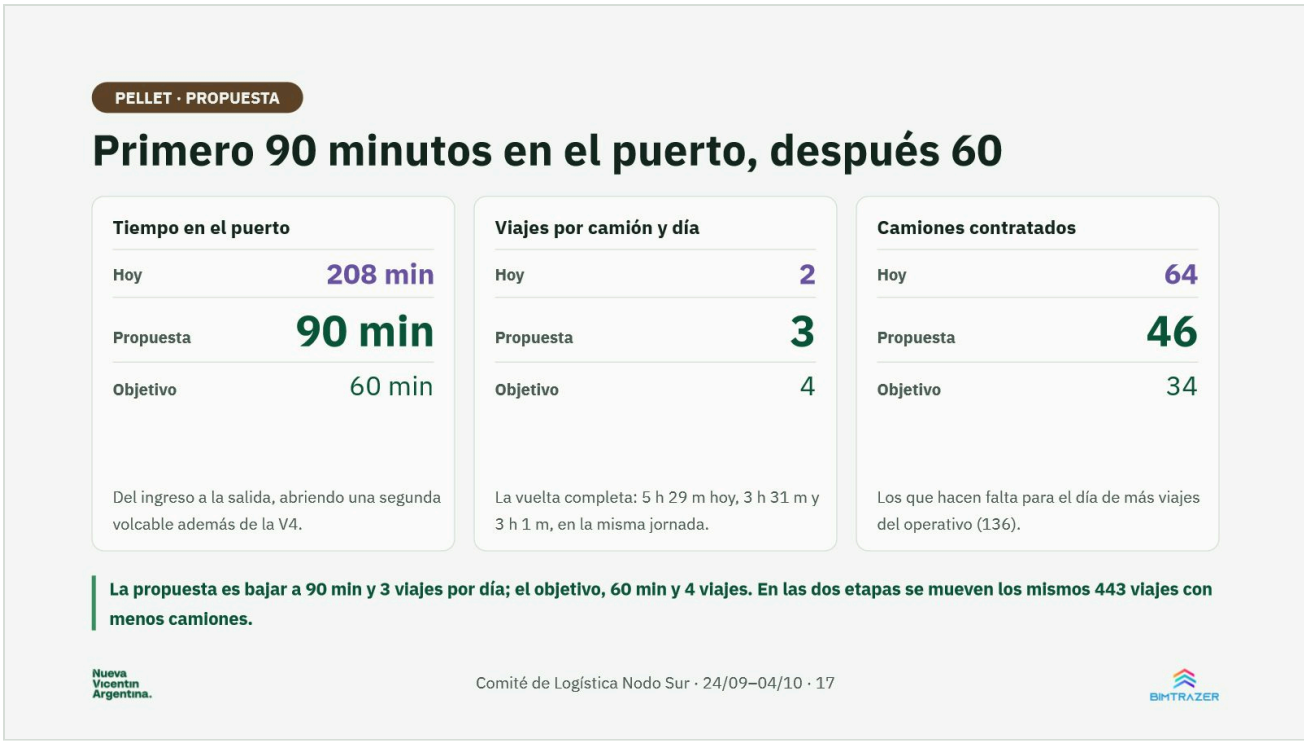

Propuesta de pellet: bajar el tiempo en el puerto de 208 a 90 min y pasar de 2 a 3 viajes por camión y día.

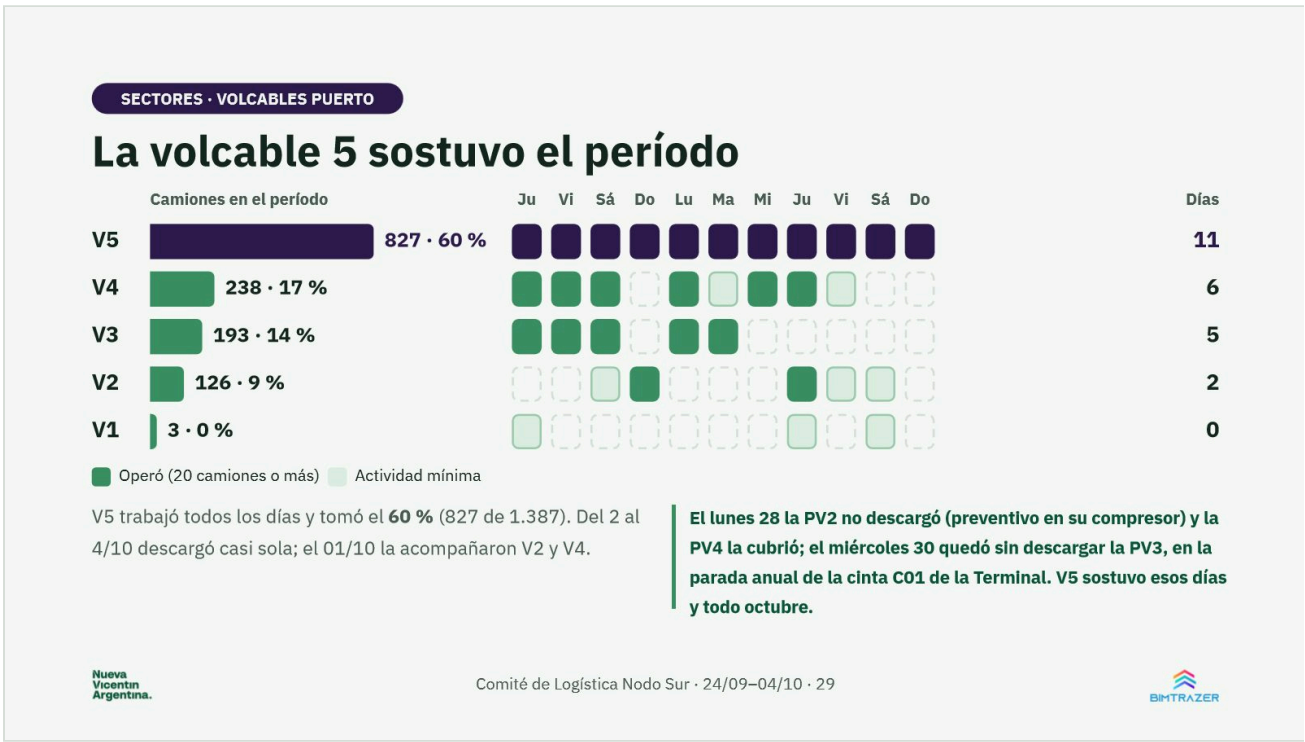

Volcables del puerto: V5 sostuvo el período con 827 camiones (60 %).

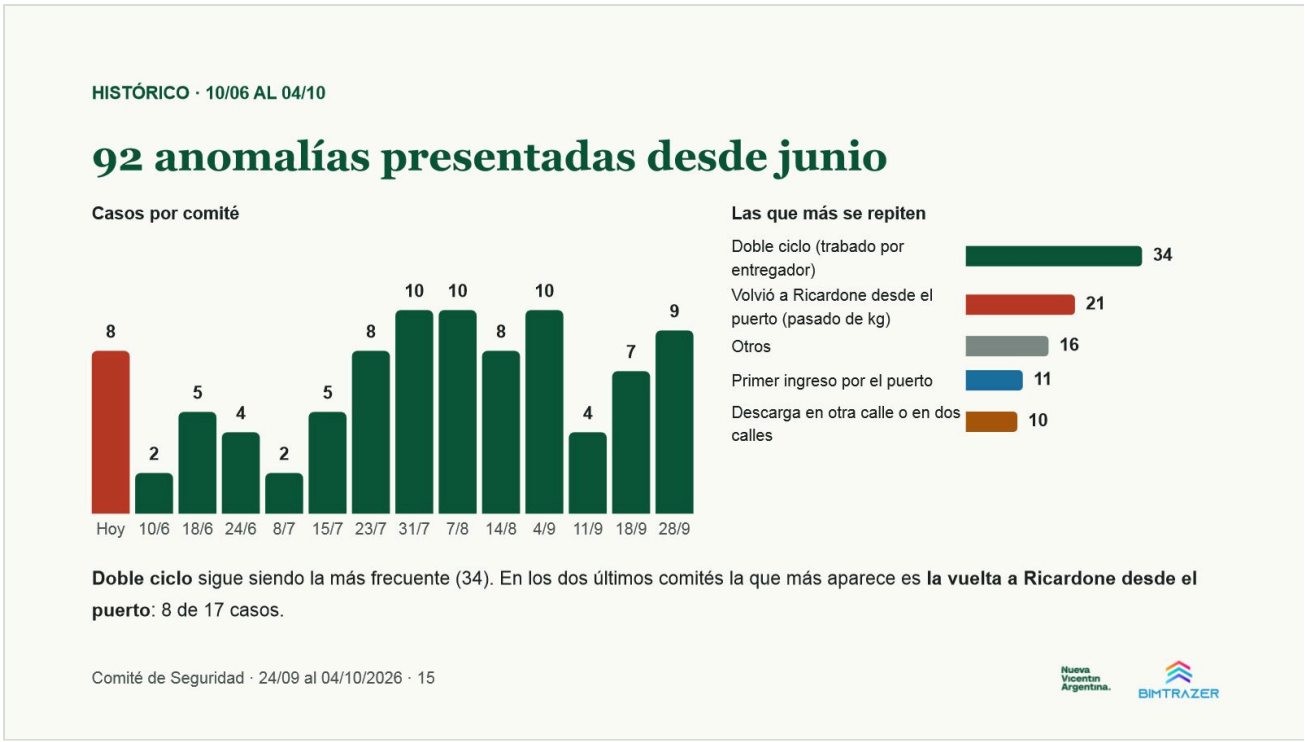

Comité de Seguridad · 92 anomalías presentadas desde el 10/06; doble ciclo es la más frecuente (34).



Caso AG847TB (26/09): fue al puerto, pasó por las dos balanzas sin descargar y volvió a calar a Ricardone.



INTERPLANTA · RICARDONE → SAN LORENZO

Diez camiones tardaron más de 30 minutos y no pasaron por la calada del puerto

Día	Salida Ric	Patente	Carga	Demora
24/09	12:50	SYB408	Soja	40 min
24/09	12:53	RXV065	Transile soja	38 min
24/09	12:56	KLW300	Soja	36 min
24/09	13:00	FDH917	Transile soja	35 min
29/09	09:49	RAW481	Transile soja	37 min
30/09	12:44	VJG112	Transile pellet	75 min
02/10	16:55	AE785KB	Soja	32 min
02/10	16:58	HDT433	Soja	37 min
02/10	16:59	IYF433	Soja	37 min
02/10	17:01	EFD127	Soja	36 min

Dos grupos de cuatro, el 24/09 (12:50–13:00) y el 02/10 (16:55–17:01), salieron de Ricardone casi juntos y entraron juntos al puerto: parece una espera en la entrada más que un desvío. VJG112 tardó 75 minutos el 30/09.

Comité de Seguridad · 24/09 al 04/10/2026 · 12

Nueva Vicentin Argentina. BIMTRAZER

Diez camiones tardaron más de 30 min entre plantas y no pasaron por la calada del puerto.

Coordinación

Fecha	Con quién	Qué se trató
14/10	Romero, Elia, Baetti, Arriola, Grassi, Caruso	Reunión de alineamiento presencial
14–16/10	CISB (Costantini)	Acceso a la vista Oracle (24 h, incluye Nodo Norte); se pide sumar plataforma declarada, calidad, humedad y preingreso

Cierre

Coordinación, resultados y pendientes

Lo que atraviesa todos los meses: con quién se coordinó cada frente, qué rindió de más a la planta y qué queda por hacer.

FEBRERO → OCTUBRE DE 2026

Feb–Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Cierre

Coordinación por actor

Buena parte del trabajo no se vio en los comités: fue coordinar la instalación, la red y los datos con cinco equipos distintos.

Actor	Qué se coordinó	Resuelto	Abierto
Enesimal (Germán Giró, Agustín Ríos, Eleazar Garrido)	Arquitectura cámaras–DSS–Edge–servicio (19/03), rutas válidas, salida a producción (06/05), microservicio de logística (02/09), fin de instalación (17/09)	Edge y Service operativos, 60 cámaras, base de eventos estable	Paginación y retención; exportes sin identificador de viaje desde el 27/08 (se reparan con un script); fase 2
IT e Infraestructura NVA (Luciano Baetti, Gastón Distefano, Juan Pablo Martínez)	Red no apta (25/03), sala de servidores (30/03), infraestructura y cámaras (19/06), relevamientos, accesos y permisos, alta AWS	Servidor DSS y VPN, criterios de cable aceptados (21/07)	Red y energía de S10 Ricardone desde el 31/07; VPN de red a red para llevar todo a la nube
A&T e Instalación NVA (Lucas Gobbo, Franco Mazzetti, Walter García)	Coordinación de obra (25–26/05), norma de instalación (29/05), montajes observados (02/06), cable antirroedores (14/07), calibración con 48 h de aviso	Ricardone y puerto instalados y calibrados	UPS y 5 LPR; nota firmada del cable
CISB / sistema de camiones (Ariel Aichino, Luciano Costantini)	Acceso automático a los datos (30/09), Meet del 05/10, acceso Oracle (14/10)	Consulta directa a Oracle SGC desde el 15/10	Sumar plataforma declarada, calidad, humedad y preingreso a la vista
Logística y operación NVA (Strada, Scandolo, Falletti, Doin, Buseghin, Astorquia, Silva)	Validación de circuitos (marzo), restricciones de proceso (07/07), nombres de playas (agosto), flota y pellet (octubre)	Circuitos validados, Playa 1 como nombre del precalado	Horario fijo del comité; flota, tarifa y segunda volcable
Gerencia (Marcelo Trivero)	Separación de comités (04/08), pasados de kg (06/10), alineamiento (09–14/10)	Comités separados	Confiabilidad y beneficios antes de la fase 2
Mantenimiento	OT 2025–2026 (mayo), SFTP cada 15 min (agosto), EAM automático (22/09)	Cruce OT × descargas en los comités	Eventos de planta en tiempo real

Resultados: lo que rinde de más a la planta

Desde que rige el cupo de ingreso cada 2 h (agosto), el ciclo de la soja bajó 13 % y la misma flota alcanza para unos 15 % más de viajes. El pellet puede bajar el flete $ 13,3 M por operativo. Todas las cifras salen de los comités y son estimadas.

1. Lo logrado: la soja hace más viajes con la misma flota

R7 soja, promedio de los comités	Antes (10/06–07/08)	Desde agosto (14/08–04/10)	Diferencia
Espera en Playa 1 (min)	132	104	−28 (−21 %)
Espera en el puerto (min)	108	111	+3
Ciclo puerta a puerta (min)	370	321	−49 (−13 %)

- Con un ciclo 13 % más corto, la misma flota alcanza para unos 15 % más de viajes.

- Con unos 2.500 camiones de soja por semana, equivale a unos 375 camiones más por semana, alrededor de 12.700 t de capacidad de recepción, siempre que el puerto los absorba.
- La mejora vino de Ricardone; la espera del puerto no bajó. Es una correlación: las cámaras miden permanencia, no causas.

2. Menos flete de transile: el pellet

El comité del 24/09–04/10 (láminas 16 a 18) propuso bajar el tiempo del pellet en el puerto, abriendo una segunda volcable además de la V4.

Pellet de girasol	Hoy	Propuesta	Objetivo
Tiempo en el puerto (min)	208	90	60
Viajes por camión y día	2	3	4
Camiones contratados	64	46	34
Flete por tonelada	$ 6.000	$ 5.000	$ 5.000

- Con los mismos 443 viajes, el flete baja $ 13,3 M en un operativo, y $ 101,2 M si los 7 operativos desde junio se hubieran pagado a $ 5.000/t.
- El camionero cobra menos por viaje pero gana más por día: de $ 360.000 a $ 450.000 con 3 viajes.
- Es una propuesta, no un ahorro logrado

Pendientes y próximos pasos

Quedan dos decisiones en manos de NVA y cinco trabajos por delante.

Esperan una decisión de NVA

Qué	Quién	Desde
Red y energía para la cámara S10 de Ricardone	IT y Eléctrico NVA	31/07
Decidir la fase 2 con la evidencia de confiabilidad	Gerencia NVA	09/10

Lo que sigue

Qué	Para qué	Quién
Reingeniería de balanzas automáticas	Con las cinco volcables, el cuello del puerto pasa a ser la balanza	NVA y Enesimal
Calibrar el simulador con las semanas del 07/09 y 13/07	Mostrar escenarios confiables antes de decidir cupos y flota	BIMtrazer
Mejorar la lectura nocturna de las cámaras	Iluminación y limpieza en los puntos con más tránsito de noche	Enesimal y BIMtrazer
Desplegar la plataforma en la nube junto a TruckFlow	Usuarios y roles; requiere VPN de red a red	BIMtrazer, Enesimal e IT NVA
Presupuesto de cámaras para el Nodo Norte	Repetir el mismo esquema en las plantas del norte	A&T
